

Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2023-10-19

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls framdrift av byggprojektet.

Tider

Samordning pågår för de upphandlade delarna, där det är viktigt att entreprenörerna delar sina tider från respektive beredning. För tillfället påverkar de aktiva entreprenaddelarna varandra för framdrift.

Aktiviteter

Gjutning av källarytterväggars är färdigställd.

Externa arbeten med mediaförsörjning pågår.

Entreprenader

Följande är avtalade under perioden:

- Inget aktuellt

Etablering

Byggström

Inga förändringar är planerade.

Internet

Inga förändringar är planerade.

VA

Inga förändringar är planerade.

Skalskydd & Skyltning

Inga förändringar är planerade.

ID06

Inga förändringar är planerade.

Påverkan

Inget att rapportera.

Framdrift

Enligt plan.

Upphandlingar


Upphandling pågår enligt följande:

- Pågår för värme- och sanitetsentreprenaden
- Brandtätningar
- Håltagningar
- Ställningar

Ekonomi

Påverkan på slutkostnaden går ännu inte att bedöma, då upphandlingar fortsatt pågår. Korrigerings kommer att ske, där delar av annat projekt placerats i detta projekt.

Övergripande bild över ekonomin (2023-10-17):

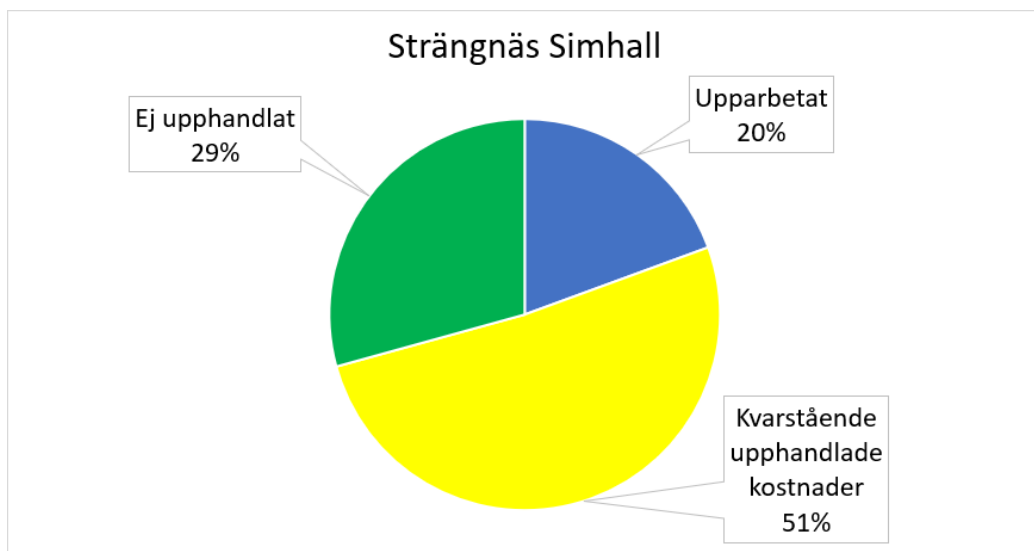

Summering

Byggnaden är tydlig, genom att källarväggarna är på plats. Beakta att plan två sträcker ut över källarväggarna på den västra sidan. Under den senaste perioden har vi fått vinterklimat, som kan påverka framdriften, men gjutningar fungerar väl ner till minus fem grader.

Göteborg 2023-10-19

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen.
